

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, *Klimatklivet*)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn 70896 Eriksdalsbadet, Täckning av äventyrsbadets utebad

Åtgärdens start- och slutdatum 2018-08-24 t.o.m. 2019-11-01

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag Fastighetskontoret, projekt- och upphandlingsavdelningen
Kontaktuppgifter
 Namn Mark Shafti
 e-postadress mark.shafti@stockholm.se
 tfn 08-50826925

Ekonomisk uppföljning**Grunduppgifter**

Total investering	4,2 mnkr
Beviljat belopp (kommunalt)	4,2 mnkr
Beviljat belopp (statligt)	

Utfall

Prognos resterande år 800 000,00

Eventuella avvikelser
 Vi jobbar nu med de sista attraktionerna och har nyligen gjutit väggar med mera. Några betonggjutningar kvar gällande golv utanför poolerna & sarger. Därefter torkning samt montering glasträcken och marksten med mera. Mätning och beställning av poolskyddet sker i dagarna.

Det var planerat till att färdigställas sommar 2019 dock på grund av projektet komplexitet kan entreprenören färdigställa projektet hösten 2019. Denna typ av projektet anses vara innovativt projekt. Vi jobbar för att utedelen av badet öppnar i november.

Förseeningen beror på projektets komplexitet.

Under projektets gång har bl.a. nedanstående förändringar skett som bidragit till ändrad tidplan:

- Ändring till en mycket komplicerad pooltäckning som krävt grundundersökning, pålning, avancerade betongkonstruktioner samt nydragning av samtliga vattenreningsinstallationer.
- Uppgjutning av betongsarger som avgränsning för ny pooltäckning.
- Byggnation av ett gångbart skyddstak över pooltäckningsparkeringen med konsoler och halkskyddad trall som personsäkerhetsåtgärd.
- Byggnation av vattentätt installationsrum med manlucka för pooltäckningens motor samt installationer för detta.
- Nydragning & nydragning av all poolbelysning då de befintliga armaturena och den befintliga kanalisationen var obrukbar.
- Ändring/byte från befintliga skvalprännor till nya skimmerlådor för att passa den nya pooltäckningen.
- Nya vattenattraktioner samt styrinstallationer för detta.
- Hålltagnings- & rivningsarbeten för ny poolparkering, ny belysning, nya attraktioner samt rivning av befintlig trappa.
- Tillgänglighetsanpassning av poolen med helt ny trappa i betong samt nya handledare & kontrastmarkeringar.
- Rivningsarbeten för samt flytt av undervattensattraktion som hamnar under ny tillgänglighetsanpassad trappa.
- Ändring från behållande av befintliga klinkerplattor till att riva allt befintligt, applicera tätskikt samt montera nya klinkerplattor överallt.
- Utökad projektering som förseerat både produktionsstart och pågående arbeten med anledning av byte till helt ny metod för pooltäckningen.
- Utökad tid för hyra väderskydd med anledning av ovanstående med mera.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts


Går ej att mäta i nuläge effekter före- och efter.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter



Produktionsbilder

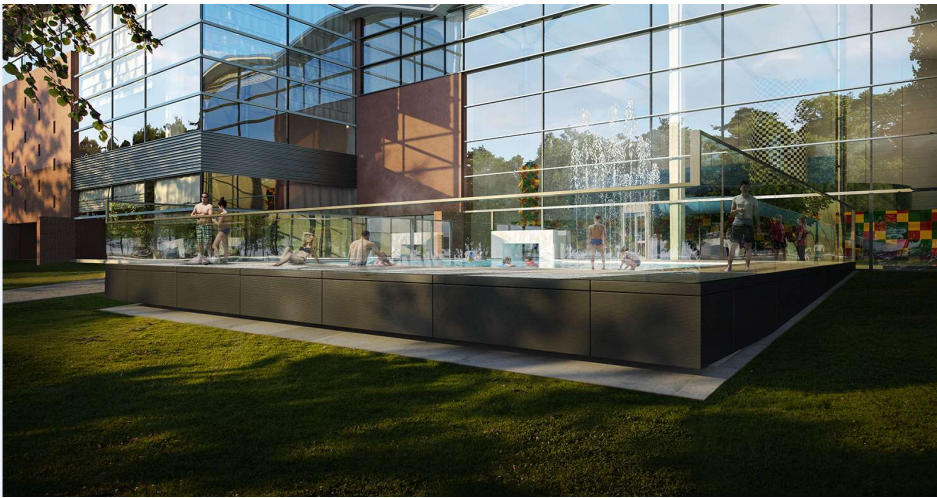

Visualiseringsbild





Förberedelse inför pågjutningen
