


Projektnamn	Upprustning Knutby motionsspår
--------------------	--------------------------------

Geografisk plats för investering	Bromsten, Spånga-Tensta
---	-------------------------

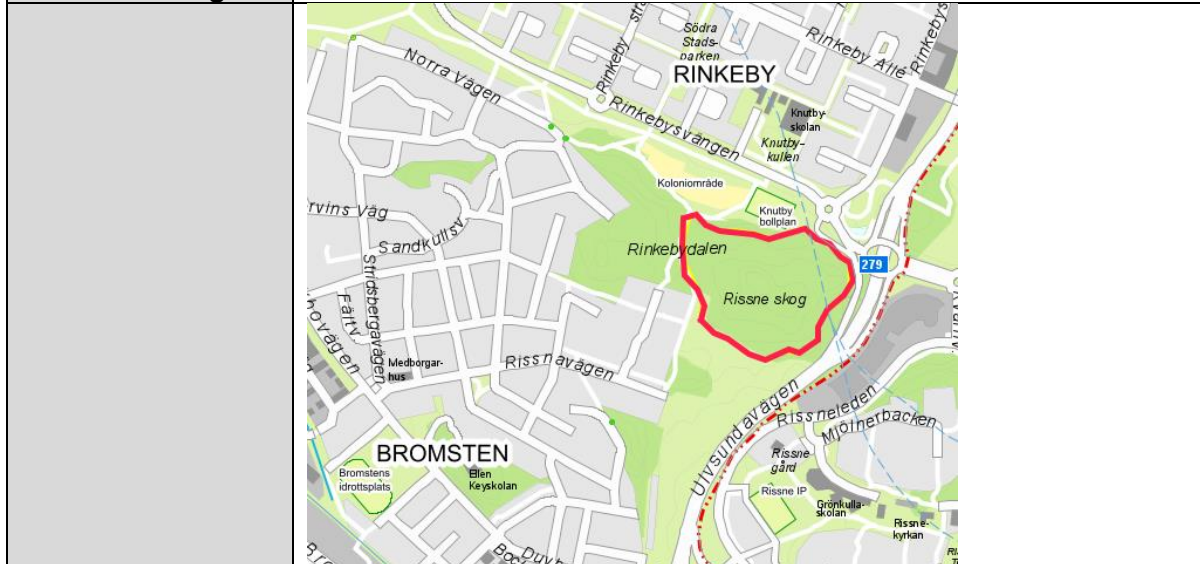

Projektets mål och syfte	<p>En motionsslinga som av många ses som osäker plats som inte gärna besöks på mörkare tider av året. Den fick nerslag i idrottsförvaltningens inventering under förra året, där ibland att belysningen var dålig. Stadsdelen mottar regelbundet synpunkter gällande trygghetsfrågor i detta område samt att belysningen varit svår att hålla efter i driften.</p>
---------------------------------	--

Slutredovisning/delredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Insatserna med belysningen och vegetationsröjningen har fått mycket uppskattning av invånarna och positiv media. Riskträd och störande vegetation har kunnat tas bort och belysningsstolparna av trä har besiktats och bytts ut där det behövts. Arbetet med ytterligare röjningar har slutförts under 2021.</p>		
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Arbeten	Budget 300 000	Utfall 2021 304 000

Bilder före	
Bilder efter	
