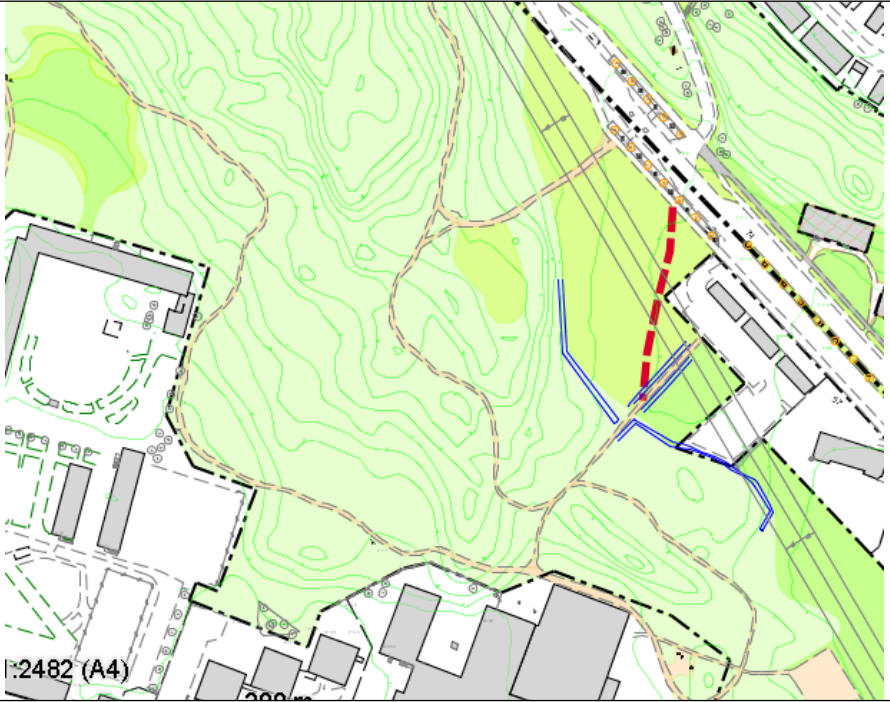


Projektname	<i>Belysning gångväg från Spångavägen till Nya Elementar</i>
Geografisk plats för investering	<i>Spångavägen, Åkeshov</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Stadsdelsförvaltningen har mottagit återkommande önskemål från skolans föräldraförening om behovet av att med förstärkt belysning trygga barnens skolväg från Spångavägen genom skogspartiet till grundskolan Nya Elementar. Vägen från busshållplatsen till skolan används frekvent och skogspartiet fram till det belysta motionsspåret är mörkt och upplevs som osäkert under årets mörka månader. Sträckan från busshållplatsen till det belysta motionsspåret saknar belysning. Gatubelysningen från Spångavägen räcker heller inte till och kan därför inte lysa upp sträckan fram till det belysta motionsspåret.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Effekten av åtgärden kan analyseras först efter kommande hösten och vintern 21/22 eftersom sträckan saknade belysning tidigare och projektet blev färdigställt i slutet av december -20. Utvärdering kommer därmed att ske genom en enkätundersökning till skolans elever våren 2022 i samverkan med skolan Nya Elementar.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Förvaltningen ansökte om 500 tkr och beviljades 500 tkr. Utfallet av projektet blev 493 tkr.

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.



Bilder efter

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

