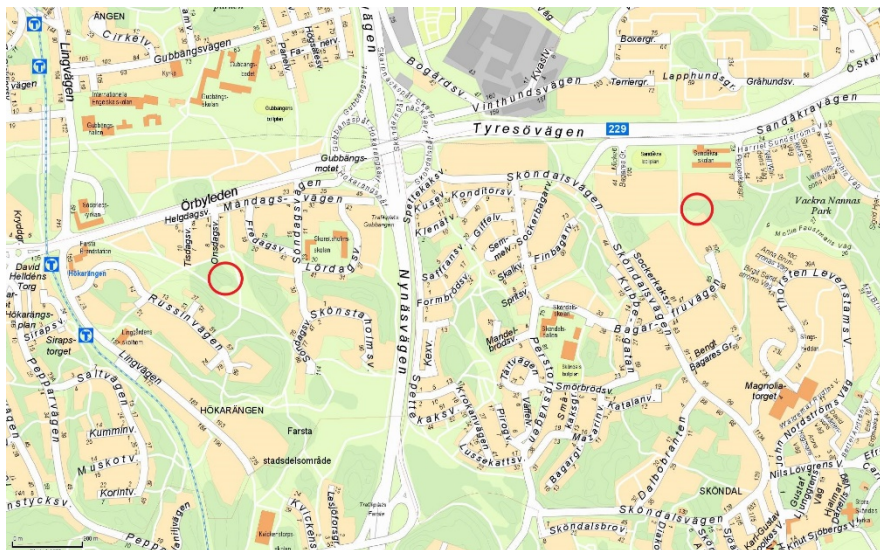


Projektnamn	Genomförande Belysning Starrmyran och Semlan
Geografisk plats för investering	<i>Parklekarna Semlan i Sköndal samt Starrmyran i Hökarängen</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Insatsen bestod i att investera i 16 nya belysningspunkter i Semlan samt 11 nya belysningspunkter i Starrmyran. Målen var:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ökat antal som känner sig trygga att vistas utomhus. - Fler som besöker verksamheterna under årets mörka perioder. - Tillsammans med andra insatser i närmiljön ett minskat antal personrån i Sköndal. - Parkleken Starrmyran är särskilt välbesökt av tjejer. Insatserna kommer att öka deras trygghet. - Minskad vandalisering - Färre inbrott

Delrapport/slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>Projektet är genomfört med mycket gott resultat. Ett flertal boende har reagerat positivt och hört av sig både via mail och telefon. Vi bedömer att det är fler som besöker platserna kvällstid nu p.g.a. den nya belysningen.</p> <p>Det är ännu för tidigt att se förändringar i antal personrån och minskad vandalisering.</p>
--	--

<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Inga avvikelser.</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Beviljat belopp var på 3 000 000 kr. Budgeterat för Starrmyran var 1 350 000 kr och för Semlan 1 700 000 kr.</p> <p>Totalt utfall blev 2 573 497 kr varav 1 104 706 för Starrmyran och 1 468 791 kr för Semlan.</p>

<p>Bilder före</p>	<p><i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i></p> <p>Semlan före.</p>  <p>Semlan efter:</p>
---------------------------	--



Semlan före 2:



Semlan efter 2:



Starrmyran före:



Starmyran efter:



Starmyran före 2:



Starmyran efter 2:



**Bilder
efter**

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

Se ovan.
