


Projektnamn	Hundrastgård i Norra Sköndal
Geografisk plats för investering	<i>Mellan Tyresövägen och Sandåkravägen</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Öka flödet av människor som rör sig längs med utpekade gångvägar. Fler ”kapabla väktare” som frekventerar platsen. Förebygger och förhindrar att brott sker.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Genomfört enligt plan och utan avvikelser. Förvaltningen har fått mycket god positiv respons från boende som inte bara uppskattar hundrastgården i sig utan också placeringen av den. Det enda som saknas är belysning vilket vi ska försöka ordna under 2022.</p> <p>Det är för tidigt att avgöra faktiska effekter och svårt att dra samband mellan hundrastgården och minskade brott. Det är dock ett faktum att vi har sett en stor nedgång av anmälda personrån under det senaste året.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Beviljat belopp: 400 000 kronor Utfall: 350 909 kronor</p> <p>Avvikelsen beror på att entreprenaden tog kortare tid än beräknat, samt att inga förhinder uppstod.</p>

Bilder före

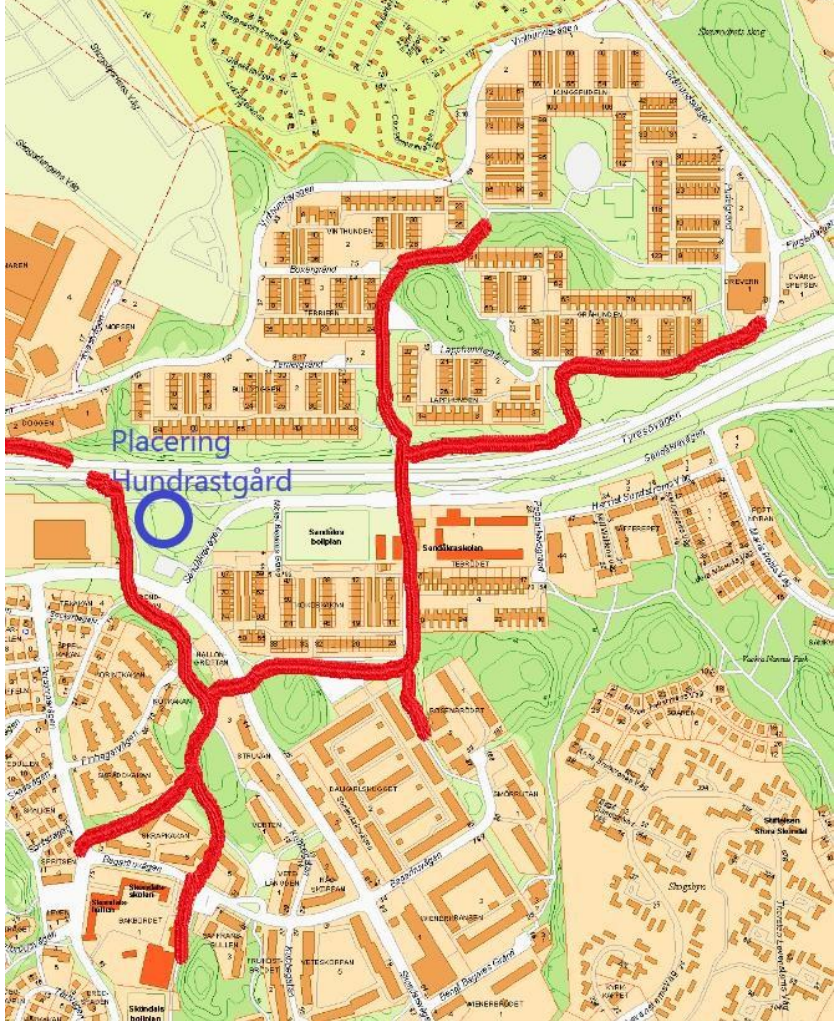

Bilder efter



--	--
