

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

70639 - Eriksdalsbad. Byte takbelysn & styrsystem Tävlings -och Undervisn.bassäng,
70640 - Eriksdalsbad. Byte takbelysn & styrsystem Träningsbassäng

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-08-24 t.o.m. 2019-04-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Fastighetskontoret, projekt- och upphandlingsavdelningen

Kontaktuppgifter

Namn

Mark Shafti

e-postadress

mark.shafti@stockholm.se

tfn

08-50826925

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering	7 000 000,00
Beviljat belopp (kommunalt)	7 000 000,00
Beviljat belopp (statligt)	

Utfall

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

4 800 000,00
2 200 000,00

Avvikelse 1. Tidplan: På grund av leveranstiden avseende armaturer fodras mertid.

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Går ej att mäta effekter före- och efter. Se nedan.


Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter



V1. Byte av belysningsarmaturer före och efter bytet.

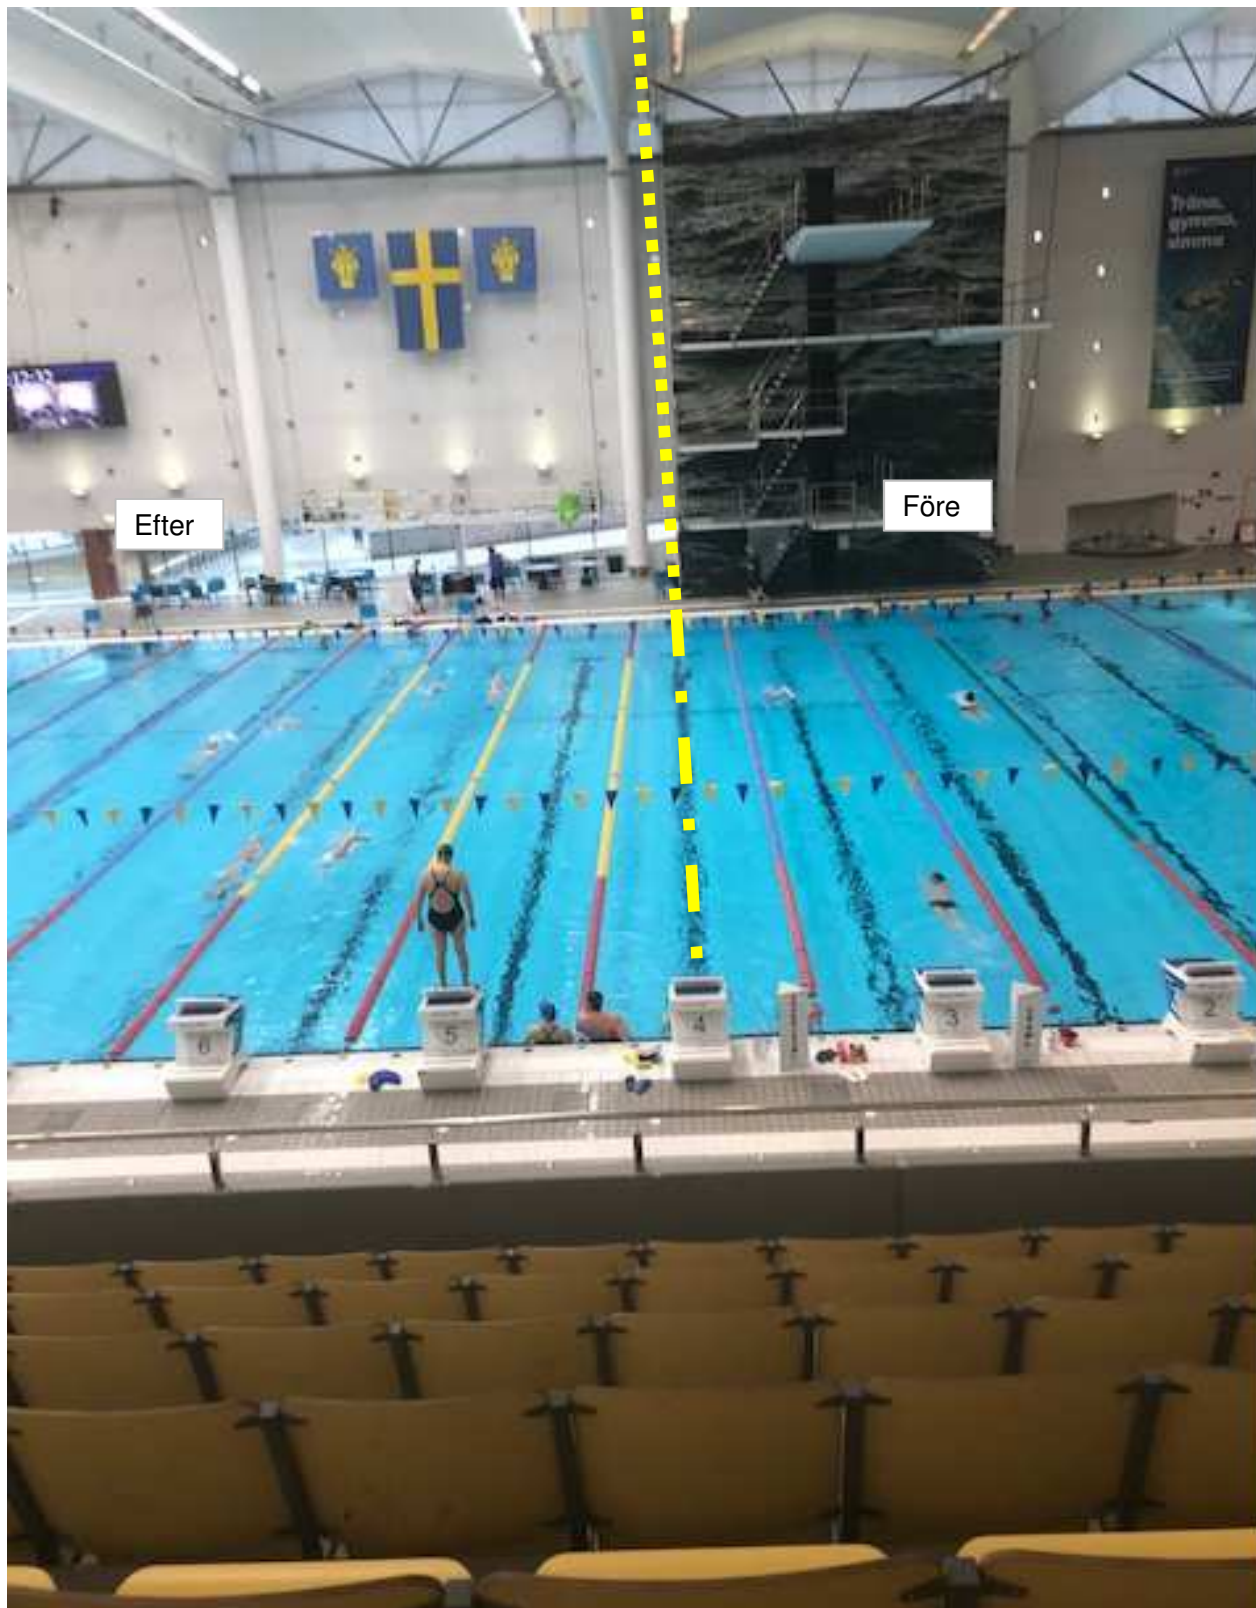

V2. Byte av belysningsarmaturer före och efter bytet.
