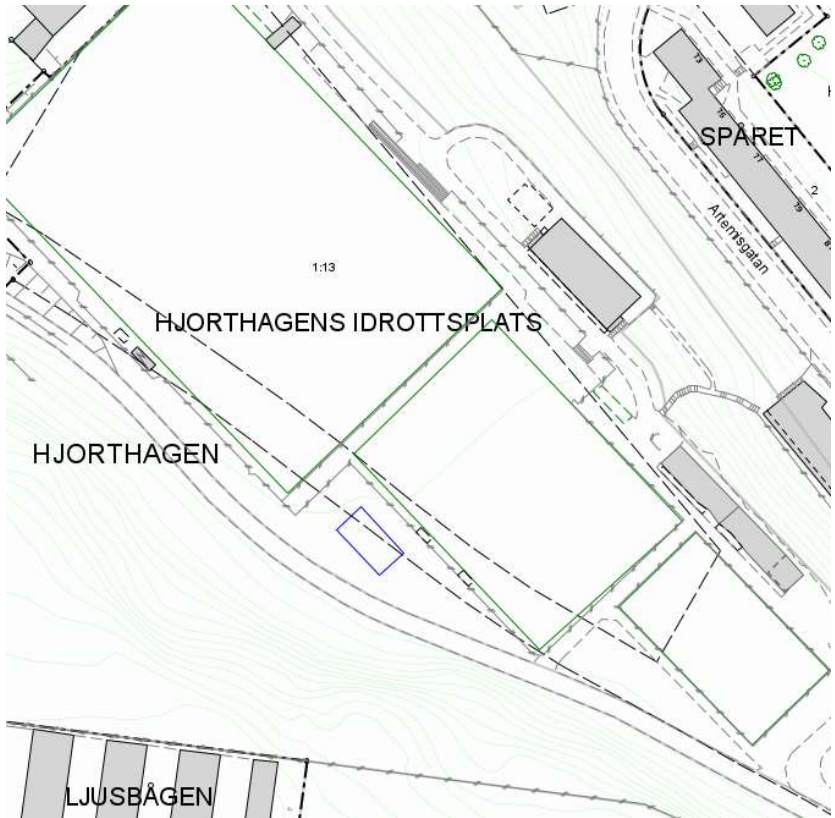


<b>Projektname</b>	Trygghetsskapande åtgärder Hjorthagens IP
<b>Geografisk plats för investering</b>	Artemisgatan, 115 43 Stockholm, Hjorthagens IP
	 <p>The map shows a topographic view of the Hjorthagens IP area. Key features include:       <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Artemisgatan</b>: A street running diagonally from the top right towards the center.</li> <li><b>SPÅRET</b>: A railway track area in the upper right.</li> <li><b>HJORTHAGENS IDROTTSPLATS</b>: A large open area in the center, outlined in green.</li> <li><b>HJORTHAGEN</b>: A residential area to the left of the sports field.</li> <li><b>LJUSBÅGEN</b>: A residential area at the bottom of the map.</li> <li><b>1:13</b>: A scale indicator in the center of the map.</li> </ul> </p>
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Genom installation av kompletterande parkbelysning på byggnader och montering av flera nya belysningsstolpar, samt röjning av sly och träd som varit i dåligt skick på området kommer förbifart på båda sidor om anläggningen kännas tryggare.</p> <p>Utredning: sep 2020        Genomförande Start: okt 2020        Genomförande Slut: december 2020</p> <p>Preliminär slutkostnad: 400 000 kronor</p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	<p>Projektet resultat speglar vad vi hade hoppats uppnå vid uppstart av projektet.</p> <p>Verksamheten har meddelat en känsla av ökad trygghet på anläggningen.</p>
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	<p>Inga avvikelser i projektets genomförande.</p>
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	<p>Utfall 2020, 411 tkr</p> <p>Slutprognos, 411 tkr</p>

Bild  
er  
före



Bild  
er  
efter



