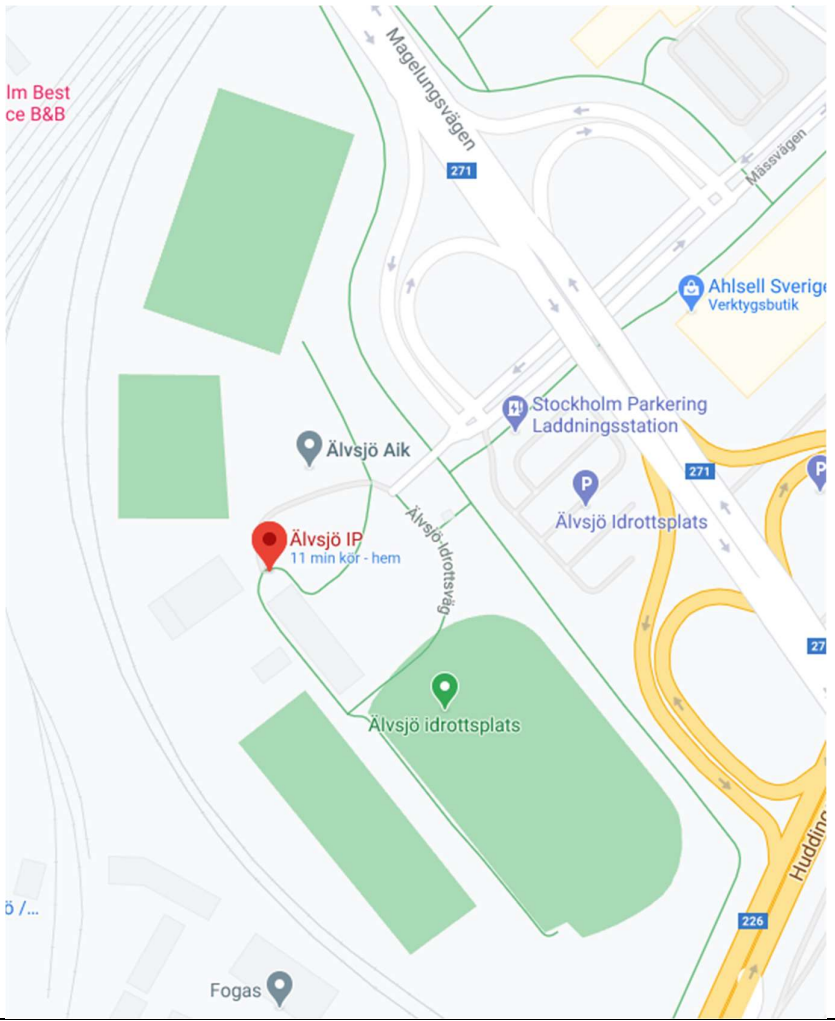


<b>Projektnamn</b>	Trygghetsskapande åtgärder Älvsjö IP
<b>Geografisk plats för investering</b>	Älvsjö Idrottsväg 2, 125 30 Älvsjö, Älvsjö IP
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Genom installation av kompletterande parkbelysning på byggnader samt nya belysningsstolpar kommer en tryggare anläggning att erhållas.</p> <p>Utredning: Juni 2020 Genomförande Start: augusti 2020 Genomförande Slut: december 2020</p> <p>Preliminär slutkostnad: 800 000 kronor</p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	<p>Projektet resultat speglar vad vi hade hoppats uppnå vid uppstart av projektet.</p> <p>Verksamheten har meddelat en känsla av ökad trygghet på anläggningen.</p>
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	<p>Inga avvikelser i projektets genomförande.</p>
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	<p>Utfall 2020, 800 890 kr</p> <p>Slutprognos, 800 690 kr</p>

<b>Bilder efter</b>	
