
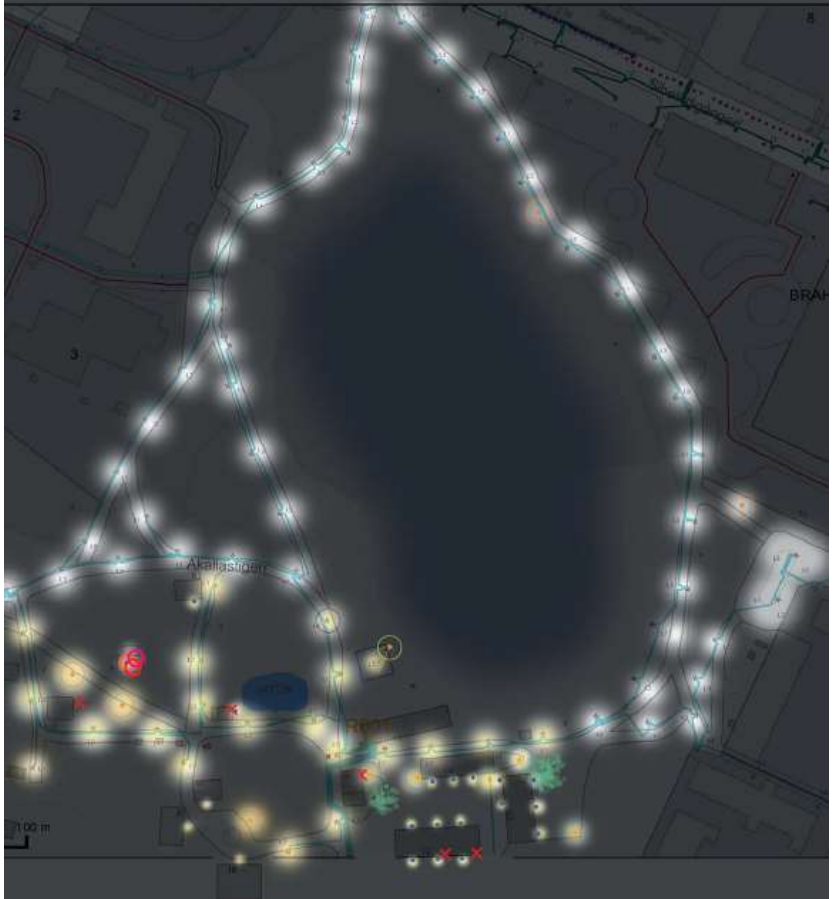


Projektnamn	Utvecklat belysningskoncept Akalla by, Akalla 4:1
Geografisk plats för investering	Akalla by, 164 78 Kista
	
Projektets mål och syfte	Målet är att skapa tryggare miljö i och omkring byggnaderna i Akalla by, detta görs via belysningskoncept som innebär att det installeras ny trygghetsskapande belysning på 5-7 byggnader. Trafikkontoret har via en utredning tagit fram ett utvecklat belysningskoncept för att skapa tryggare miljö i och runt Akalla by.

Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Från början var det tänkt att Trafikkontoret och Fastighetskontoret skulle samarbeta i detta projekt. Trafikkontoret skulle förse belysningen på gångvägarna samt scenen, fastighetskontoret skulle förse belysningen som finns på byggnaderna.</p> <p>Trafikkontoret är i dagsläget (2020.05.07) färdiga med sin del av projektet, endast små justeringar behöver åtgärdas.</p> <p>Fastighetskontoret har inte påbörjat sin del av projektet.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Fastighetskontoret påbörjade sin del av projektet med ett uppstartsmöte tillsammans med Tyren som var projektledare. Efter uppstartsmötet kom ingen uppföljning. Det byttes ut folk från Trafikkontoret och likaså med den kontakten som Fastighetskontoret hade med Tyren. Även Kundförvaltare och teknikförvaltare har bytts ut från Fastighetskontoret för Akalla By i oktober 2019.</p> <p>Idag finns en kontakt mellan Fastighetskontoret, Trafikkontoret och Tyren och Fastighetskontoret önskar slutföra sin del av projektet.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Budget 300.000 kr. Avser installationskostnad på 200.000 kr. Projektledning, uppföljning och utvärdering 100.000 kr.</p> <p>Arbetet är i uppstartsfas. Utförandefas under höst-vinter 2019.</p>



Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>

