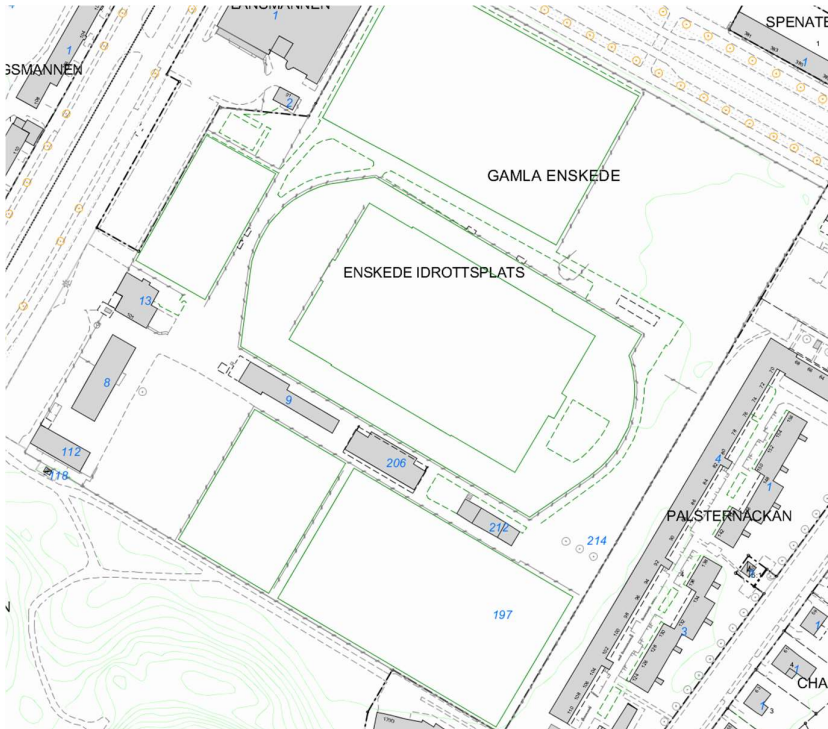


Projektname	Trygghetsskapande åtgärder Enskele IP
Geografisk plats för investering	Enskelevägen 95, 122 63 Enskele, Enskele IP
	
Projektets mål och syfte	<p>Genom installation av kompletterande parkbelysning på byggnader samt nya belysningsstolpar kommer en tryggare anläggning att erhållas.</p> <p>Utredning: Juni 2020 Genomförande Start: augusti 2020 Genomförande Slut: december 2020</p> <p>Preliminär slutkostnad: 500 000 kronor</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Projektet resultat speglar vad vi hade hoppats uppnå vid uppstart av projektet.</p> <p>Verksamheten har meddelat en känsla av ökad trygghet på anläggningen.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Inga avvikelser i projektets genomförande.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Utfall 2020, 411 tkr</p> <p>Slutprognos, 411 tkr</p>

Bilder före	
Bilder efter	
