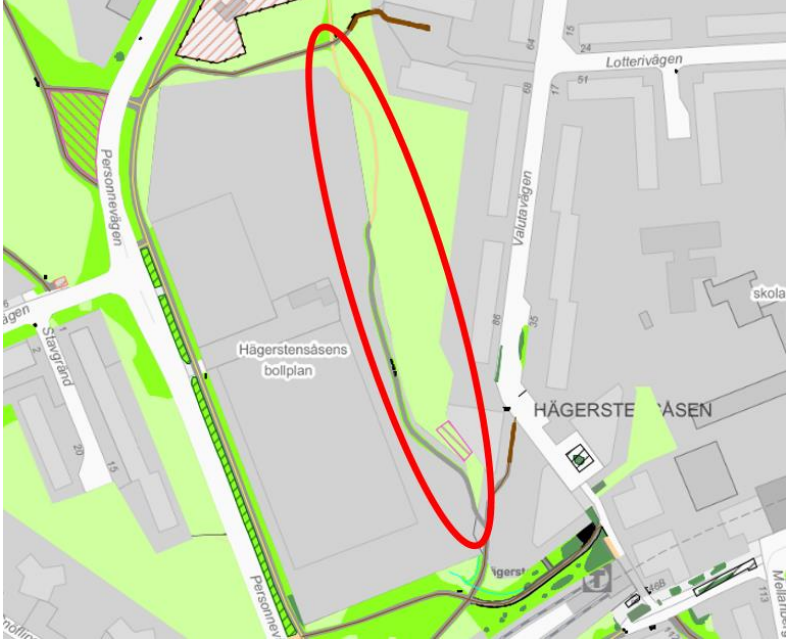


Projektname	<i>Belyst parkväg vid Hägerstensåsens bollplan</i>
Geografisk plats för investering	<i>Hägerstensåsens bollplan, Hägersten</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Stadsdelsnämnden ville tillgängliggöra en stig som nyttjats som genväg mellan Hägerstensåsen och den sekundära entrén till bollplanen. Många barn och unga har tidigare upplevt stigen som otrygg eftersom den saknar belysning.</p> <p>Stigen har rustats upp till parkvägsstandard med asfaltering och belysning och kan nu snöröjas. Även den anslutande parkvägen har breddats och försetts med belysning. Därmed har ett sammanhängande parkstråk med en asfalterad, belyst och snöröjd parkväg skapats vilket ökar tryggheten på platsen.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Tryggheten har förbättrats i området. Gångstråket har en god framkomlighet med belysning under hela sträckan.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Ursprunglig budget 1,5 mnkr Utfall: 1 560 704 kr Ökade driftskostnader med: Ränta 43 680 kr/år – beräknat på 2,8% Avskrivning 52 000 kr/år – Beräknat på 30 år <i>Summa 95 680 kr/år</i>

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>
