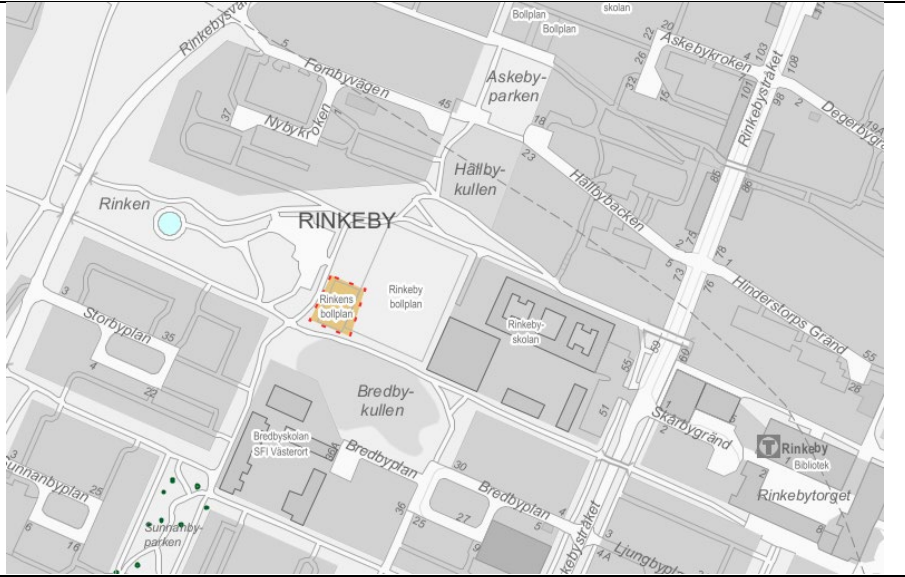


Projektname	<i>Multisportplanen i Rinkeby</i>
Geografisk plats för investering	<i>Storbyplan 37, Rinkeby</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>I stadens budget för 2024 framgår att trygghet ska vara en central del i förvaltningarnas arbete. Av medborgarundersökningen 2023 framgår att andelen invånare i Järva stadsdelsområde som upplever trygghet i stadsdelen de bor i uppgår till 60 %, jämfört med 79 % för staden totalt. Siffran för Järva stadsdelsområde är ett av de lägsta i jämförelse med Stockholms resterande stadsdelar. Arbetet med trygghetskapande insatser fortsätter där en del av arbetet innebär att genomföra olika insatser i den offentliga miljön.</p> <p>Under 2022 arbetade åtta ungdomar tillsammans med Framtidens Hus med ett projekt som kallades Trygg hemgång från Framtidens Hus. Syftet med arbetet var att delvis samla in ungdomars synpunkter om den upplevda tryggheten i Rinkeby. Under en trygghetsvandring som var ett av arbetsmomenten i projekten lyfte ungdomarna att området mellan parkleken Rinken och Bredbykullen upplevdes som en mörk och otrygg plats som dessutom ligger intill en väldigt mörk och stor fotbollsplan. Här finns en outnyttjad och sliten asfalterad basketplan. Förvaltningen planerar därför att rusta upp ytan och har tagit fram ett förslag genom dialoger och samarbete med barn och ungdomar från Rinkeby.</p> <p>Målet och syftet med projektet var att aktivera platsen tillsammans med barn- och ungdomar för att bidra till en trygg utemiljö och hemväg för barn- och ungdomar och samtidigt skapa en yta som bidrar med fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med olika behov.</p>

Slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>Planen har genomförts enligt plan och målet att renovera och tillföra utrustning för att öka möjligheten till att platsen aktiveras har uppnåtts. Att låta barn och ungdomar ha den ledande rollen i skapandet av stadsutvecklingsprojekt är jättebra och resultatet blir nästan alltid lyckat. Det gäller även i detta projekt, vilket visades tydligt under invigningen där det var många Järvabor som kom och ville fira öppnandet av planen. I dagsläget har stadsdelsförvaltningen inget verktyg för att mäta antalet besökare på spontantidrottsytor som den här planen och det är svårt att få en tydlig bild om planen kommer att nyttjas på grund av årstiden och att planen blev klar under hösten. Det går såklart att göra en upplevelsebedömning för att få en uppfattning om hur eller om en yta används. Däremot vet vi att den intelligande parkleken, Rinken, är välbesökt park och hoppas såklart att även den här planen blir det. Baserat på vår erfarenhet är ytor och anläggningar som ungdomar har varit delaktiga i mer populära och uppskattade.</p>
<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Personer var ivriga att börja använda planen, vilket gjorde att det fanns vissa utmaningar med att personer tog sig in på arbetsområdet och förvaltningen och anläggningsentreprenör fick ha en tät dialog under några av de mest kritiska anläggningsmomenten. Förvaltningen drar lärdomar om vikten av att, under hela anläggningsfasen, kommunicera arbetets olika delar och vad de innebär.</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Det ekonomiska utfallet för projektet blev större än beräknat belopp på 3,0 mnkr och landade på totalt 3,771 mnkr. Anledningen till att kostnaderna blev större var för att entreprenören inte hade lämnat anbud när medel för projektet söktes. Anläggningskostnaderna blev därför mer.</p> <p>Ekonomiskt utfall: Byggledning – 111 591 kr Besiktning – 33 444 kr Anläggning – 3 625 965 kr</p>

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.

**Bilder efter**

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.

