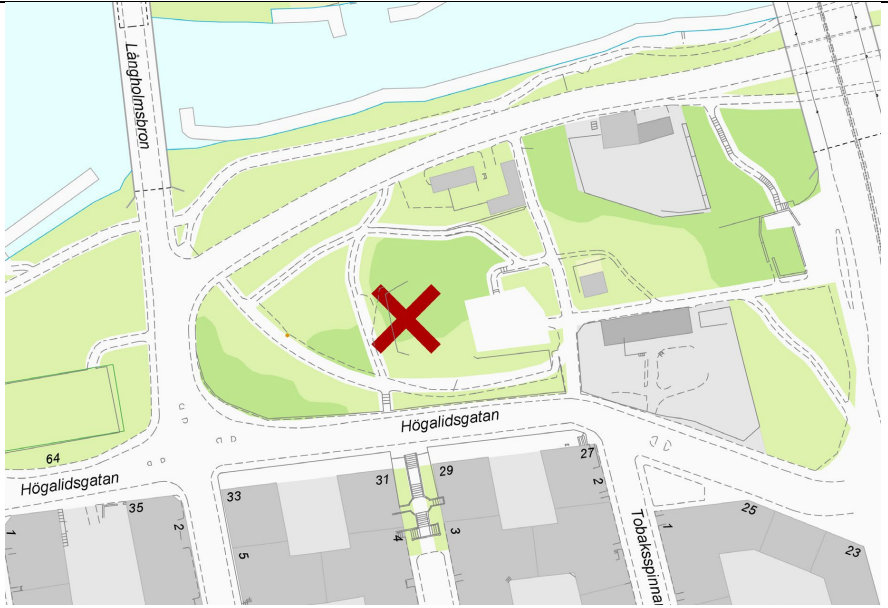


Bilaga 10

Uppföljning trygghetsinvesteringar

- Trygghetsskapande åtgärder
Pålsundsparken
- Trygghetsskapande åtgärder
Rosenlundsparken

Projektname	Trygghetsskapande fysiska åtgärder i Påsundsparken, väster om Västerbron.
Geografisk plats för investering	<i>Påsundsparken inom Södermalms stadsdelsområde.</i>
	 <p>Kartan visar platsen i Påsundsparken där de trygghetsskapande åtgärderna genomförts.</p>
Projektets mål och syfte	<p>I ett område i Påsundsparken, väster om Västerbron, har under de senaste åren haft en markant ökad otrygghetsproblematik (se karta ovan med områdets placering). Näringsidkare och boende i området har vittnat om ett nytt tillhåll av missbrukare med medföljande ordningsstörningar och öppen narkotikahandel.</p> <p>Utöver problemen med narkotikaförsäljning och eget narkotikabruk i Påsundsparken har även annan typ av brottslighet som hot, fylleri, bråk, nedskräpning (exempelvis av sprutor, kanyler, ölburkar) och skadegörelse förekommit. Då det ofta varit högljutt och stökigt i parken har boende och besökare i området undvikit att passera eller uppehålla sig på platsen på grund av att de har upplevt det som otryggt.</p> <p>Projektets målsättning har varit att bidra till en tryggare miljö på platsen och därigenom få fler att vilja uppehålla sig där.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Insatsen har omfattat ett flertal aktiviteter:</p> <ul style="list-style-type: none">• En boulebana har anlagts. Genom att en boulebana har anlagts i parken ges möjlighet till en ny aktivitet och därigenom fler besökare i parken. Enligt förvaltningen bidrar detta till att platsen upplevs tryggare.• Nya sittplatser har tillförts. De nya sittplatserna innebär att parken tillgängliggörs för fler grupper av människor. Enligt förvaltningen bidrar detta till att platsen upplevs tryggare.• Nya odlingslådor för stadsodling. En ny stadsodling kommer att starta i parken vilket innebära att den kommer att besökas av fler. Enligt förvaltningen bidrar detta till att platsen upplevs tryggare.• Ny buskplantering har anlagts. Insatsen innebär att parken upplevs som attraktiv, inbjudande och omhändertagen.• Nytt träd har planterats som ersättning för ett träd som dött. Insatsen innebär att parken upplevs som attraktiv, inbjudande och omhändertagen. Därutöver bidrar trädet till skugga heta dagar samt omhändertagande av dagvatten.• Nya skräpkorgar är beställda. Insatsen innebär att parkbesökare kan slänga medfört skräp vilket i förlängningen leder till att parken upplevs ren och välvårdad.• Ny belysning har tillförts. Insatsen innebär att platsen blir mer inbjudande att använda och besöka under den mörka årstiden vilket enligt förvaltningen bidrar till att den upplevs tryggare.• Muren kring den nya buskplanteringen har renoverats. Insatser innebär att anläggningen ser välvårdad och omhändertagen ut.
---	---

	<ul style="list-style-type: none">• Återställning av gräsytor Insatsen innebär att parken upplevs som attraktiv, inbjudande och omhändertagen. <p>Därutöver har följande driftåtgärder utförts:</p> <ul style="list-style-type: none">• Buskar har beskurits och vissa buskar har grävts bort. Insatsen innebär att insynen och överblicken i parken ökar vilket enligt förvaltningen bidrar till att den upplevs tryggare.• Slyröjning har genomförts. Insatsen innebär att insynen och överblicken i parken ökar vilket enligt förvaltningen bidrar till att den upplevs tryggare.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<ul style="list-style-type: none">• Skräpkorgarna är beställda men har ännu inte kommit på plats. Skräpkorgarna har levererats till entreprenören och kommer gjas på plats när vädret så tillåter under 2022.• Två armaturer för markbelysningen är beställda och kommer att placeras på plats under våren 2022.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Erhållna medel: 1,0 mnkr Upparbetade medel under 2021: 0,9 mnkr.

Bilder före



Trasig mur och rabattyta där buskar saknas.



Platå som saknar aktiviteter.



Buskage i behov av beskärning.

Bilder efter



Nya sittplatser, ny belysning samt ny grusgång.



Ny boulebana.




Ny buskplantering och lagad mur.



Nya odlingslådor till stadsodling.



Nytt träd.

Projektname	Trygghetsskapande belysning i Rosenlundsparken i samarbete med trafikkontoret.
Geografisk plats för investering	<i>Rosenlundsparken inom Södermalms stadsdelsområde.</i>
	 <p>Kartan visar planerade belysningsinsatser vilka markeras med rött kryss.</p>
Projektets mål och syfte	<p>Stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret har fått in många klagomål på att den östra och centrala delen av Rosenlundsparken upplevs som mörk och otrygg. Stadsdelsnämnden behandlade även i början av år 2020 ett medborgarförslag som delvis tog upp behovet av mer belysning i den centrala delen av parken.</p> <p>Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret analyserat hur belysningen fungerar i parken. Trafikkontoret har inlett arbetet med att byta ut och förbättra belysningen i parkens östra del. Den västra delen av parken har redan erhållit förstärkt belysning i samband med att området upprustades.</p> <p>Stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret har bedömt att även stadsdelens belysningsutrustning behöver åtgärdas och utvecklas för att uppnå fullgod effekt och därigenom en ökad upplevd trygghet i hela parken.</p>

Slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>De planerade belysningsåtgärderna omfattar följande delar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utbyte av 3 belysningsstolpar som ersätts med 2 nya master i den norra delen av parken. - Anläggande av 2 nya parkbelysningsstolpar mot Hallandsgatan. - En ny belysningsmast med 3 strålkastare placeras vid klätternätet. - En ny belysningsmast med 3 strålkastare placeras vid basketplanen. - Den centrala mörka delen av parken förses med belysningspollare. <p>Under året har följande insatser genomförts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tre fundament till belysningspollare har anlagts. - Kabelskyddsror har dragits mellan belysningsfundament. - Inköp av samtligt belysningsmaterial har gjorts.
<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Som beskrivits ovan har belysningsmaterialet inhandlats och fakturerats och vissa mindre åtgärder genomförts. Gällande anläggandet kvarstår ett flertal belysningsmaster och belysningspollare att monteras i parken.</p> <p>Orsaken till att samtlig belysningsutrustning inte monterats under året beror delvis på att den tidiga vintern och att tjälen hindrat möjligheten att slutföra åtgärderna.</p> <p>Den kvarstående belysningsutrustningen kommer att monteras på plats under 2022 inom ramen för ordinarie budget.</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Erhållna medel: 0,8 mnkr</p> <p>Upparbetade medel under 2021: 0,4 mnkr</p> <p>Avvikelse: 0,4 mnkr.</p>

Bilder före



Den centrala mörka delen av parken som ska förses med belysningspollare.

Bilder efter

Inga bilder finns då åtgärderna inte är slutförda.
