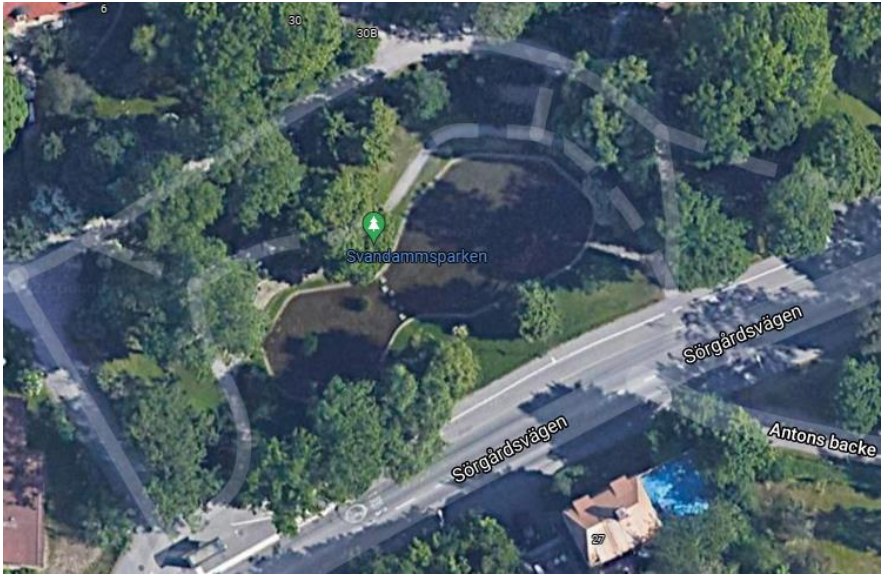


<b>Projektnamn</b>	Svandammen - belysning
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Svandammen, Spånga-Tensta sdf</i>
	<p><i>Eventuell kartbild.</i></p> 
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Vid den trygghetsvandring som gjordes hösten 2020 i Spånga så uppkom Svandammsparken som en otrygg plats, framförallt med brist på belysning.</p> <p>Parken är i dagsläget delvis upplyst på den omkringliggande asfalterade vägen men saknar belysning inne i parken. Komplettering av belysning behövs längs grusvägarna, intill bänkar och längs dammkanten för att ljusa upp gräsytan och parkområdet.</p>

## Redovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	<p>Förarbeten med grävningar och ledningsdragning är färdiga men armaturer har ännu inte kunnat placeras på grund av leveransförseningar.</p>
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	<p>På grund av pandemin har leveranser av armaturer avsevärt försenats. Detta i koppling till den extrema kyla som kom i början av vintern har gjort att projektet inte kunnat slutföras som tänkt. Under vårvintern 2022 förväntas allt vara färdigställt.</p>
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	<p>Sökta och beviljade medel 400 000 kr Upparbetad kostnad 311 000 kr</p> <p>Då projektet försenats önskas ombudgetering med 100 000 kr.</p>

<b>Bilder före</b>	<p><i>Infoga <b>om</b> bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i></p>
<b>Bilder efter</b>	<p><i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i></p>
