


Projektname	Mötesplats Rågsved (Bäverdalens BP)
Bäverdalens BP i Rågsved	Bäverdalens BP i Rågsved
	
Projektets mål och syfte	<p>Bäverdalens bollplan i Rågsved är idag en mörk, nedgången och eftersatt bollplan. Den används oregelbundet eftersom det är en grusplan. I dagsläget önskar föreningar, allmänhet och skolor att träna och spela på konstgräs. Målet är att skapa en trygg och säker miljö där idrottsutövare kan utnyttja anläggningen året om med konstgräs och ispist på vintern.</p>

Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	I dagsläget inget att redovisa, då projektet har pausats och kommer att återupptas under 2020.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Kontoret har vid tre tillfällen gått ut med förfrågningsunderlag för detta projekt. Entreprenörerna har överklagat stadens tilldelningsbeslut alla tre gånger. Så staden har nödgats avbryta upphandlingen.</p> <p>Eftersom anståndet för medel från Boverket sträcker sig till 2019-10-31 har kontoret skickat en begäran till Boverket om att få återlämna beviljade medel. Enligt Boverkets hemsida kommer dessvärre ingen mer utlysning ske i denna form.</p> <p>Fastighetskontoret har trots uteblivna medel från Boverket valt att fortsätta med projektet. I dagsläget pågår upprättande av förfrågningsunderlag. Målet är att lägga ut FU på Tendsign (stadens system för förfrågningsunderlag) under våren och att arbetet ska påbörjas med entreprenör under sommaren 2020.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Beviljade medel har återlämnat till Boverket. Kostnader som är upparbetade är kostnader för projektering. Total projekteringskostnad 1,3 mnkr

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>

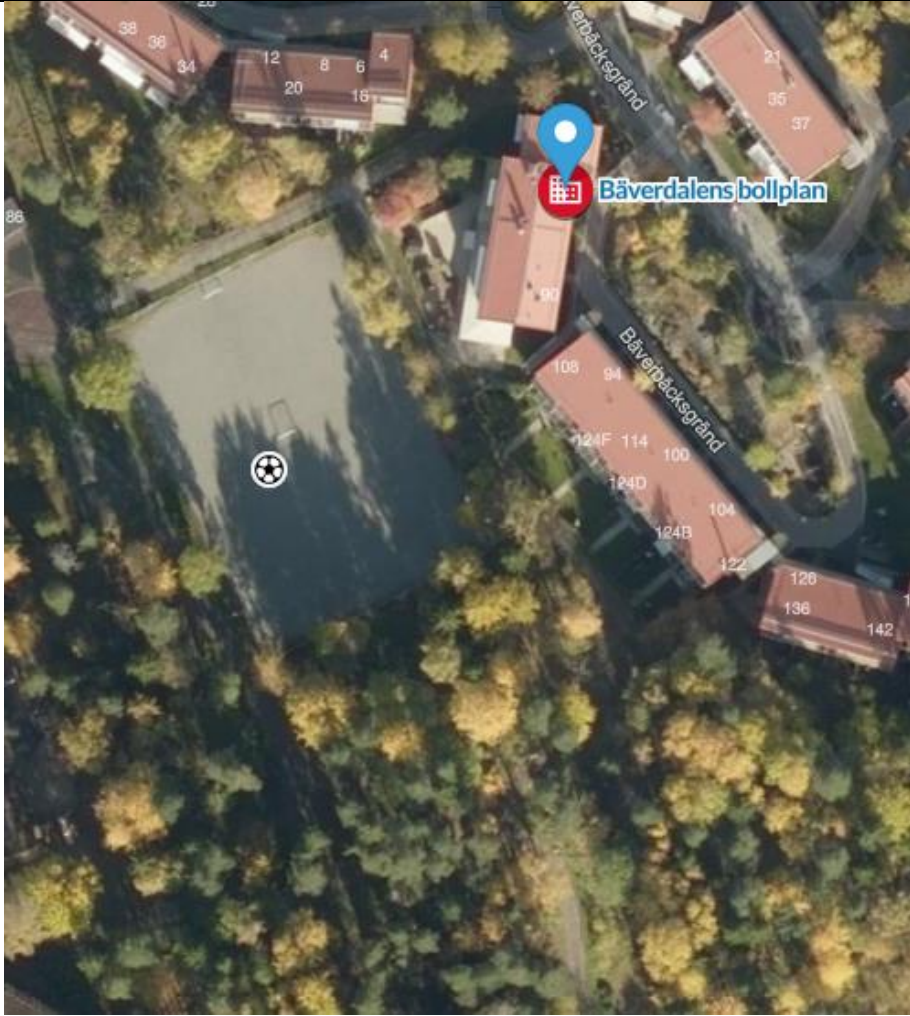
