



<b>Projektamn</b>	<b>Förbättrad belysning gångtunnlar 0,9 mnkr</b>
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Hässelby- Vällingby, 5 olika gångtunnlar</i>  <ol style="list-style-type: none"><li>1. Abiskovägen gångtunnel under T-bana</li><li>2. Frostviksgatan</li><li>3. Astrakangatan gångtunnel under T-bana</li><li>4. Fyrspanngatan</li><li>5. Bräckeatan</li></ol>
<b>Projektets mål och syfte</b>	Mål och syfte med projektet har varit att förbättra den upplevda tryggheten genom att förbättra belysningen i 5 gångtunnlar.

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	Projektet har genomförts tillsammans med Trafikkontoret och utförts av TKs upphandlade entreprenör. Belysning är installerad på alla 5 platserna.
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	Inga avvikelser.
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	Budget 900'000 kr. Utfall 813'000 kr.  Differens mellan budget och utfall beror på att bl.a. schaktning kunnat genomföras enklare än beräknat.

**Bilder före**

*Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.*

**Abiskovägen gångtunnel under T-bana:**

Obelyst tunnel som kom upp som ett önskemål på en trygghetsvandring.

**Frostviksgatan:**

- Ny belysning under faret vid Frostviksgatan

**Astrakångatan gångtunnel under T-bana:**

- Ny belysning i tunnel under T-banan Astrakångatan




**Fyrspannsgatan:**

- Byta icke adekvat belysning i tunnel under Fyrspannsgatan

**Bräcke gatan:**

Befintlig belysning är inte installerad, underhållen eller adekvat fungerande.

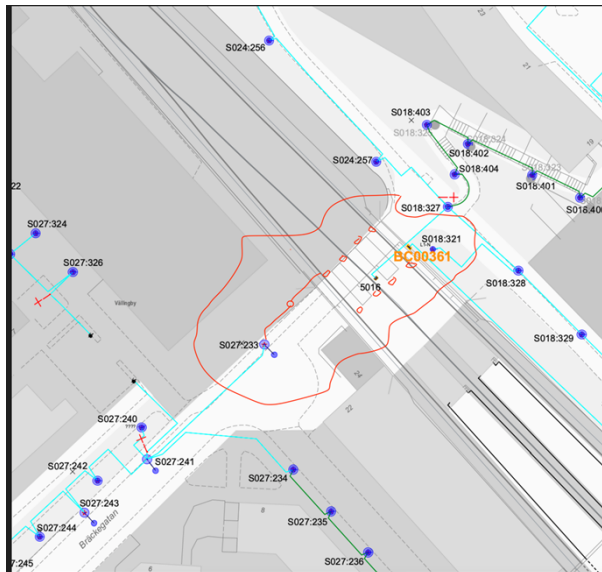



**Bilder efter**

*Bilder saknas.*
